


# 鶴見川人道橋整備ニュース


両岸の橋台と左岸側橋脚が完成しました！

令和3年11月に工事着手し、このたび両岸の橋台と左岸側のP1橋脚が完成しました。令和5年11月から右岸側におけるP2橋脚の工事、令和6年度から上部工事を予定しています。引き続き、鶴見川人道橋事業へのご理解とご協力のほどよろしくお願いいたします。



今回**完成**した箇所

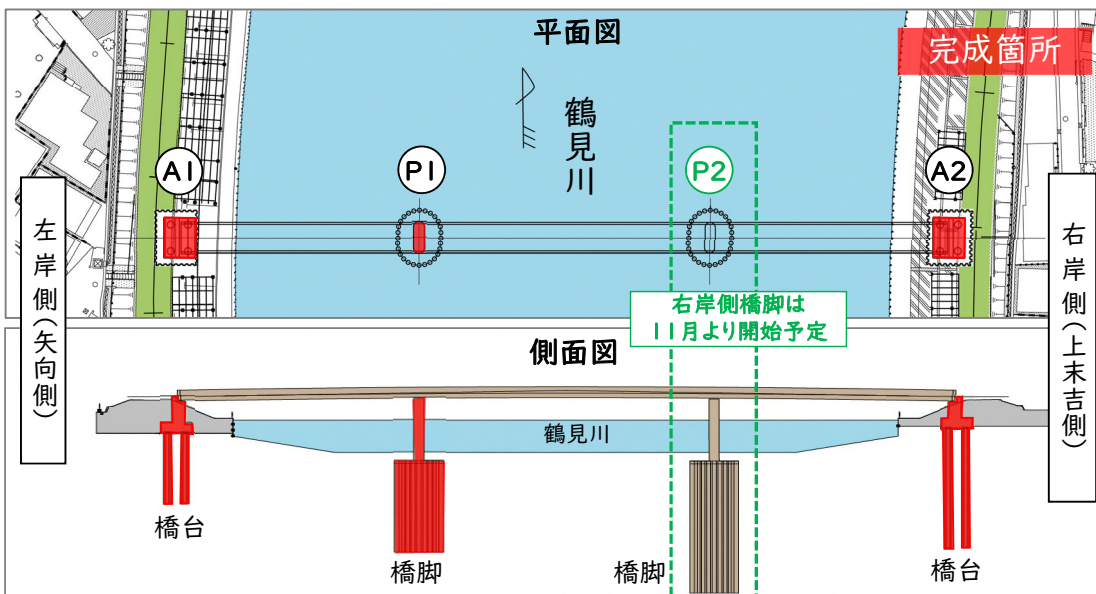




状況写真

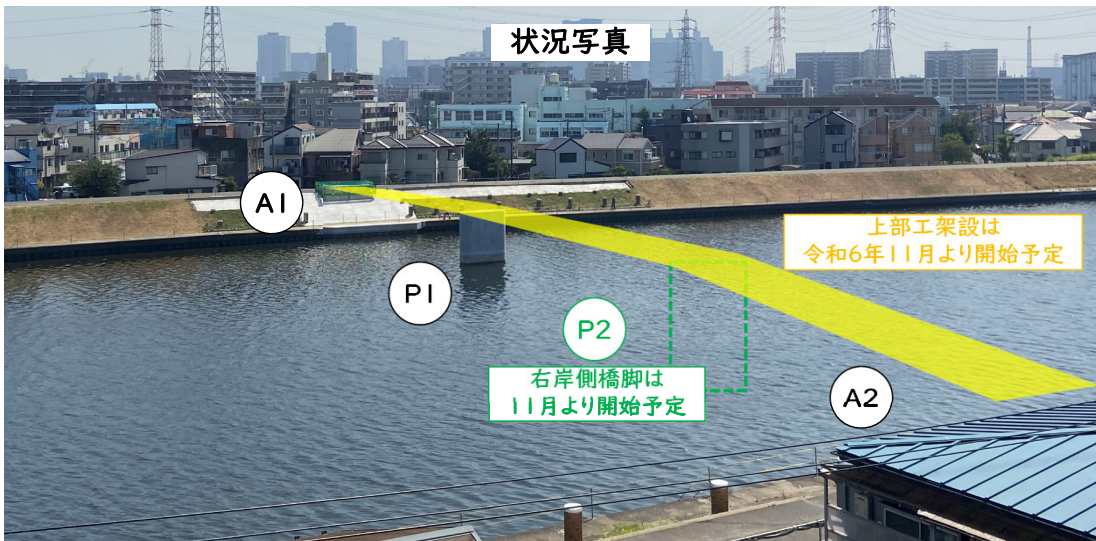

## 橋台の工事写真 (A1,A2)

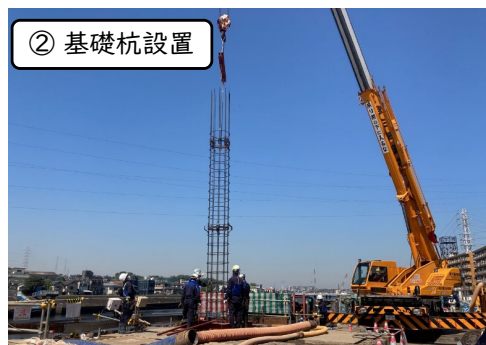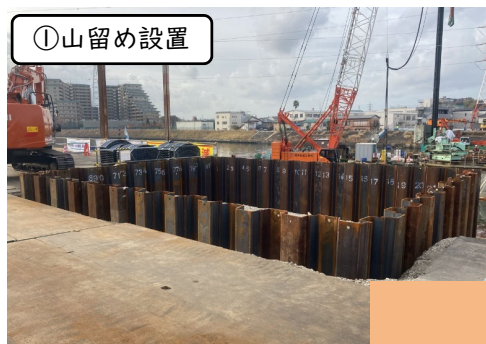

## 橋脚の工事写真 (P1)

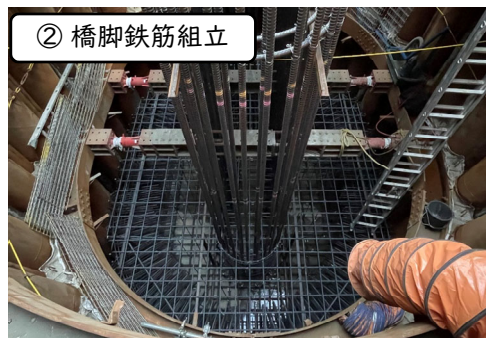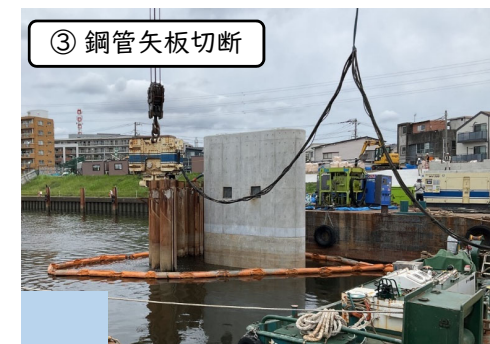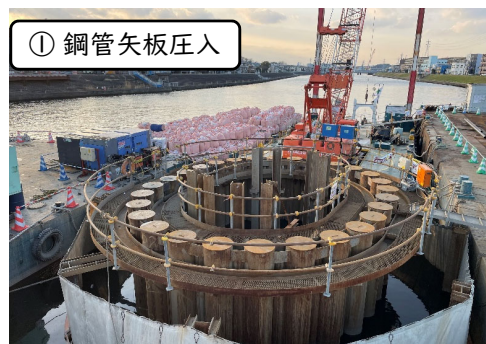

# 河川管理用通路の通行止めについて

今期の工事通行止め予定期間（右岸側を通行止めします。）

**令和5年10月16日～令和6年6月30日**



- ・河川管理用通路の通行止めに伴い、歩行者の方、自転車の方は下記の迂回路をご利用ください。
- ・新鶴見橋から資機材を搬出入する際は、一時的にお待ちいただくことがあります。交通誘導員等がご案内、誘導いたします。



# 早期完成に向けて、引き続き工事を進めます！

## ①上部工の製作・架設工事

上部工の製作工事を令和5年3月に契約しました。台船による架設時の状況を想定して、桁を吊る位置や使用する台船の規格等も検討しながら工場で作成を進めます。

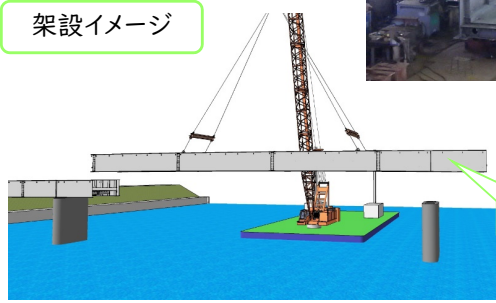

台船による河川内での架設を行います！

橋長 : 約113m  
幅員 : 約4m  
重量 : 約180トン

## ②右岸側の橋脚工事(P2)

右岸側の橋脚工事を令和5年11月の渇水期から実施します。施工方法は左岸側P1と同じですが、基礎が深くなるのが想定されるため、施工方法や資機材の配置などに十分に検討して安全に作業します。

## 今後の工事予定

令和7年春の完成を目指して工事を進めます

工種	2023年(令和5年)				2024年(令和6年)												2025年(令和7年)	
	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	春	
P2橋脚工																		
上部工製作																		
上部工架設								準備									架設	完成予定

※スロープ工事は令和6年度中の実施を予定しています

## お問い合わせ

●事業に関すること  
横浜市 道路局 建設部 橋梁課  
TEL : 045-671-2796  
FAX : 045-662-3945  
E-mail : [do-kyoryo@city.yokohama.jp](mailto:do-kyoryo@city.yokohama.jp)

●工事に関すること  
五洋建設株式会社  
TEL : 045-515-3073  
FAX : 045-654-4872

事業に関する情報を横浜市道路局のHPに掲載しています
