
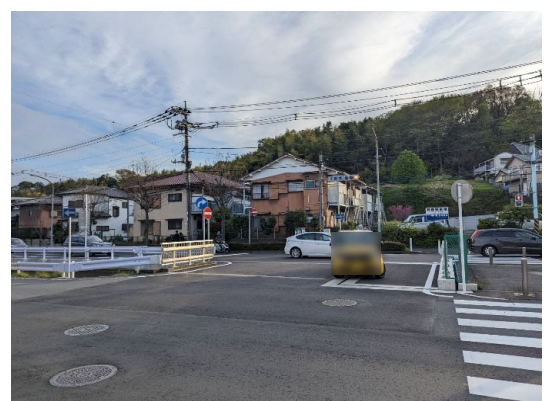


令和5年度 道路改良事業完成箇所の整備効果

事業名称	主要地方道横浜生田平原橋交差点道路改良事業		
事業期間	平成31年度～令和5年度	事業箇所	青葉区元石川町5420番地5地先
事業費	175,879千円		
事業内容	交差点整備 整備延長L=60m 計画幅員12.90m(車道9.9m、歩道3m片側)、現況幅員10.11m(車道7.11m、歩道3m片側)		
事業効果	(実施前) 本事業箇所は、右折レーンが設置されておらず、信号現示による右折車両の誘導ができないため、右直事故が多発している交差点であり、「事故危険箇所」にも指定されていました。また、高欄やフェンスが重なる現場状況によって車両から歩行者が見え辛く、地域住民から交通安全対策の実施を強く要望されていました。 (実施後) 張出し構造の車道を設け、右折レーン50.0mを新たに整備しました。また、橋梁部を2.5m拡幅し、橋上での車両のすれ違いが可能になるよう整備しました。 [効果] 右折レーンの新設により、右直レーンでの右折待ちによる滞留が改善されました。また、橋梁部を拡幅したことにより、交差点内での右折車の走行性・視認性が改善し、歩行者の安全性が確保されました。 交差点内での車両のすれ違いが円滑になり、安全性が向上しました。 [地元町内会等の意見等] 右折車待ちによる滞留がなくなって良かった。歩行者が安心して通行できるようになりました。 令和6年4月1日供用開始		



実施前

実施後
